

市町村名	久米島町						
<b>平成28年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】</b>							
事業番号・事業名	4-①	子育て支援事業					
担当部課名	環境保全課	事業実施(予定)年度 平成28~32年度					
		沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 生活環境基盤の整備及び教育・医療・福祉におけるサービスの向上					
		沖縄振興基本方針該当箇所 III-9					
事業内容	子育て支援の充実を図るため、幼児から小学生が気軽に安心安全に遊べる施設を整備する。また、家族連れの観光客が安心して遊べる公園を整備することにより、観光地としての魅力アップを図る。						
効果発現年度	<input type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(33年度)						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他( )						
<b>予算額・執行額</b> 【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)		28年度	28年度(繰越)	29年度	32年度	33年度	
	<b>予算の状況</b>	(a) 当初予算額	42,064	—			
		(b) 予算現額	65,274	—			
		(c) 増減額(b-a)	23,210	—			
		(d) 繰越額	0	38,880			
		A. 計(b+d)	65,274	38,880			
	B. 執行済額	26,281	38,880				
	うち交付金充当額	21,024	31,104				
	次年度繰越額	38,880	0				
	執行率(%) (B/A)	40.3%	100.0%				
予算の状況の説明	発注した遊具は受注生産となっており、遊具製作機械の故障等で生産が追い付かず、納期を延長することとなったため平成29年度に繰り越して実施した。当初計画していた事業内容をすべて実施した他、活動目標、成果目標の達成状況を鑑みて適正と考えている。						
<b>活動目標(指標)及び達成状況</b>	H28活動目標(指標)		達成状況				
			28年度	29年度	30年度	31年度	
	ふれあい公園遊具の設置	目標	( 遊具の設置 )	( )	( )	( )	
		実績	遊具の設置完了				
		目標	( )	( )	( )	( )	
実績							
達成状況説明	平成28年度を繰り越した後に、平成29年度内において遊具の設置を完了した。						
<b>成果目標(指標)及び進捗状況</b>	H28成果目標(指標)		基準値(年度)	28年度	29年度	30年度	目標値(33年度)
	遊具整備率(全体3公園)	目標	( )	( 33% )	( )	( )	( )
		実績		33%			
	公園内の遊具を充実させることで子育て支援体制の整備を図る。	目標	( )	( 子育て支援体制の整備 )	( )	( )	( )
		実績		子育て支援体制の整備			
【H33成果目標】 当該施設の整備により利便性が確保されたか(80%以上)を含め、当該事業のあり方をアンケートで検証する。	目標					80%	
進捗状況説明	平成29年4月において整備が完了し、5月から供用開始されており子育て支援体制の整備に向けて全体3公園の1/3にあたる33%が整備できた。						


	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
取組の検証	<ul style="list-style-type: none"> <li>遊具の設置は完了したが、危険な遊び方をしていたり、ごみのポイ捨てをする利用者が見受けられた。</li> <li>工場内遊具製作機械の故障で生産が追いつかず、納期が延長することとなったため、平成28年度中に事業が完了せず、繰越が必要となった。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>子どもが安心・安全で遊べる環境づくりのため、遊具および公園の適正な管理が必要である。</li> <li>確実に事業が遂行できるよう、早期発注を行い、再発防止に努める必要がある。</li> </ul>

**今後の取り組み方針**

・公園及び遊具に危険な箇所がないか、定期的に巡回・点検を行う。また、公園及び遊具が不適正な使用がされないように、看板を設置し注意喚起を継続して行っていく。  
 ・繰越の再発防止のため、早期発注を行い、残りの公園については確実に整備を進めていく。

**資金の流れ**  
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費
65,161	65,161	52,128	13,033	0

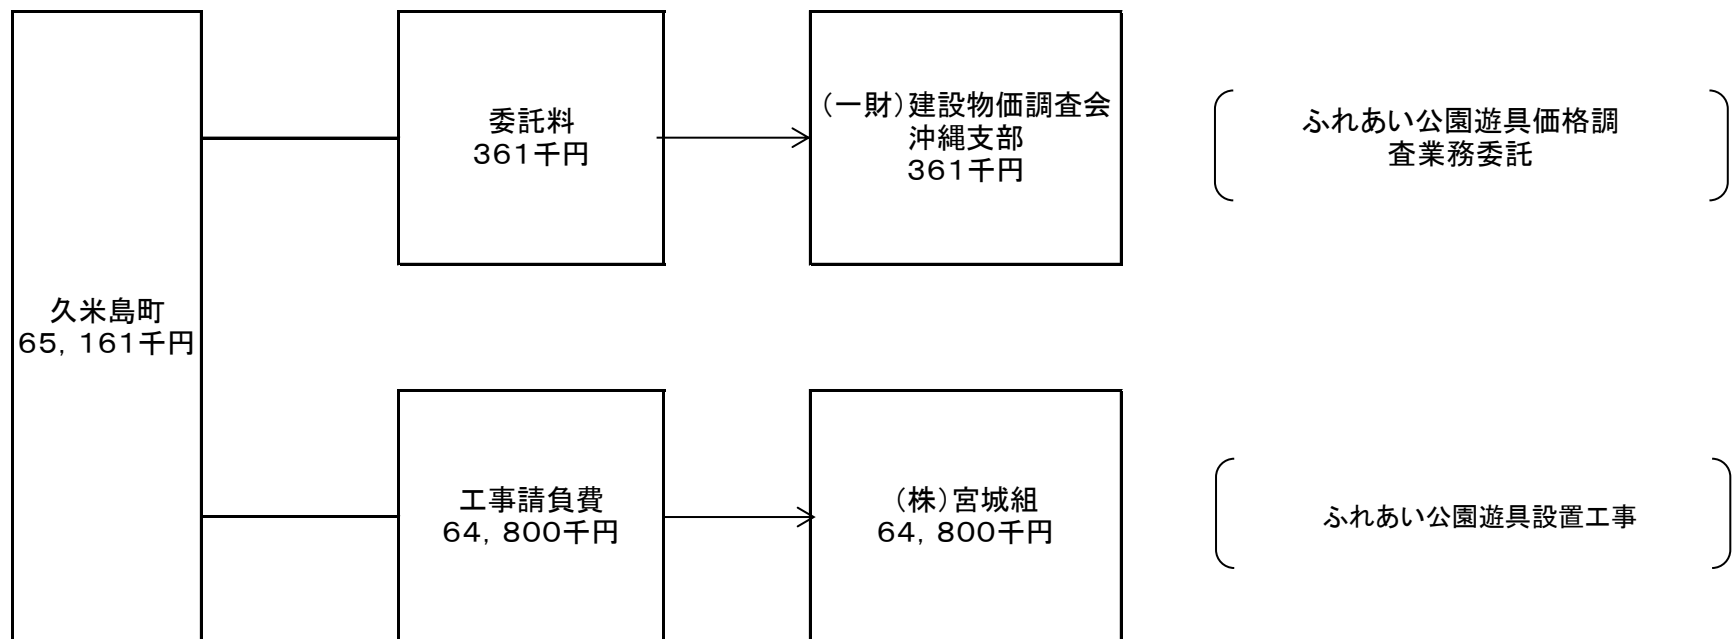

資金の用途の点検・評価	評価	点検項目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○委託事業者・施工業者は指名競争入札により企業組織、実績、知識等を勘案した上で選定しており妥当であったと考えている。 ○不用額はなく適正な予算規模であった。 ○費目・用途については事業目的達成の観点から必要なものなのか等について確定時において支出の等に関する書類により確認、適正であった。
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	
	-	受益者との負担関係は妥当であるか。	
	○	費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	

市町村名	久米島町						
<b>平成28年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】</b>							
事業番号・事業名	4-②	火葬場・葬祭場施設整備事業			沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-3-(11)-イ	
担当部課名	環境保全課	事業実施(予定)年度	平成28~29年度	沖縄振興基本方針該当箇所	生活環境基盤の整備及び教育・医療・福祉におけるサービスの向上		
事業内容	葬儀に係る町民負担の軽減を図るため、火葬場及び葬祭場を整備する。						
効果発現年度	<input type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(30年度)						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他( )						
予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)		28年度	28年度(繰越)	29年度	32年度	33年度	
	予算の状況 (a) 当初予算額 (b) 予算現額 (c) 増減額(b-a) (d) 繰越額 A. 計(b+d)		521,772	—			
			542,257	—			
			20,485	—			
			0	446,653			
			542,257	446,653			
		B. 執行済額	95,602	393,143			
		うち交付金充当額	76,481	314,515			
		次年度繰越額	0	0			
		執行率(%) (B/A)	17.6%	88.0%			
	予算の状況の説明	当初計画していた委託業務の中で、地盤(支持層)が想定外に深い箇所にあったため関連する業務に不測の時間を要し、年度内の完了が困難となり繰り越すこととなった。					
活動目標(指標)及び達成状況	H28活動目標(指標)		達成状況				
			28年度	29年度	30年度	31年度	
	・火葬場・葬祭場施設実施設計	目標	( 実施設計 )	( )	( )	( )	
		実績	実施設計				
	・火葬場・葬祭場建設工事	目標	( 建設工事 )	( )	( )	( )	
		実績	建設工事				
達成状況説明	当初計画していた事業内容をすべて実施他、活動目標、成果目標の達成状況を鑑みて適正と考えている。						
成果目標(指標)及び進捗状況	H28成果目標(指標)		基準値(年度)	28年度	29年度	30年度	目標値(30年度)
	・火葬場・葬祭場施設実施設計の完了	目標	( )	( 実施設計の完了 )	( )	( )	( )
		実績		実施設計の完了			
	・火葬場・葬祭場建設工事の完了	目標	( )	( 建設工事の完了 )	( )	( )	( )
		実績		建設工事の完了			
		【H30成果目標】 葬祭場利用件数	目標				45件
進捗状況説明	当初、計画しておりました委託業務3件・工事5件を予定とおり発注し、平成30年3月に工事が完了した。						


	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
取組の検証	施設の整備については、目標どおり実施したことから、今後は、町民に施設を有効活用してもらうことが課題となる。	新たに整備された葬祭場において葬儀を執り行うことに対する町民の心理的な支障や不安が生じないように配慮する必要がある。

**今後の取り組み方針**

・施設の利用方法などを丁寧に広報・案内し、町民が利用しやすい環境づくりに努める。

**資金の流れ**  
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費
488,745	488,745	390,996	97,749	0

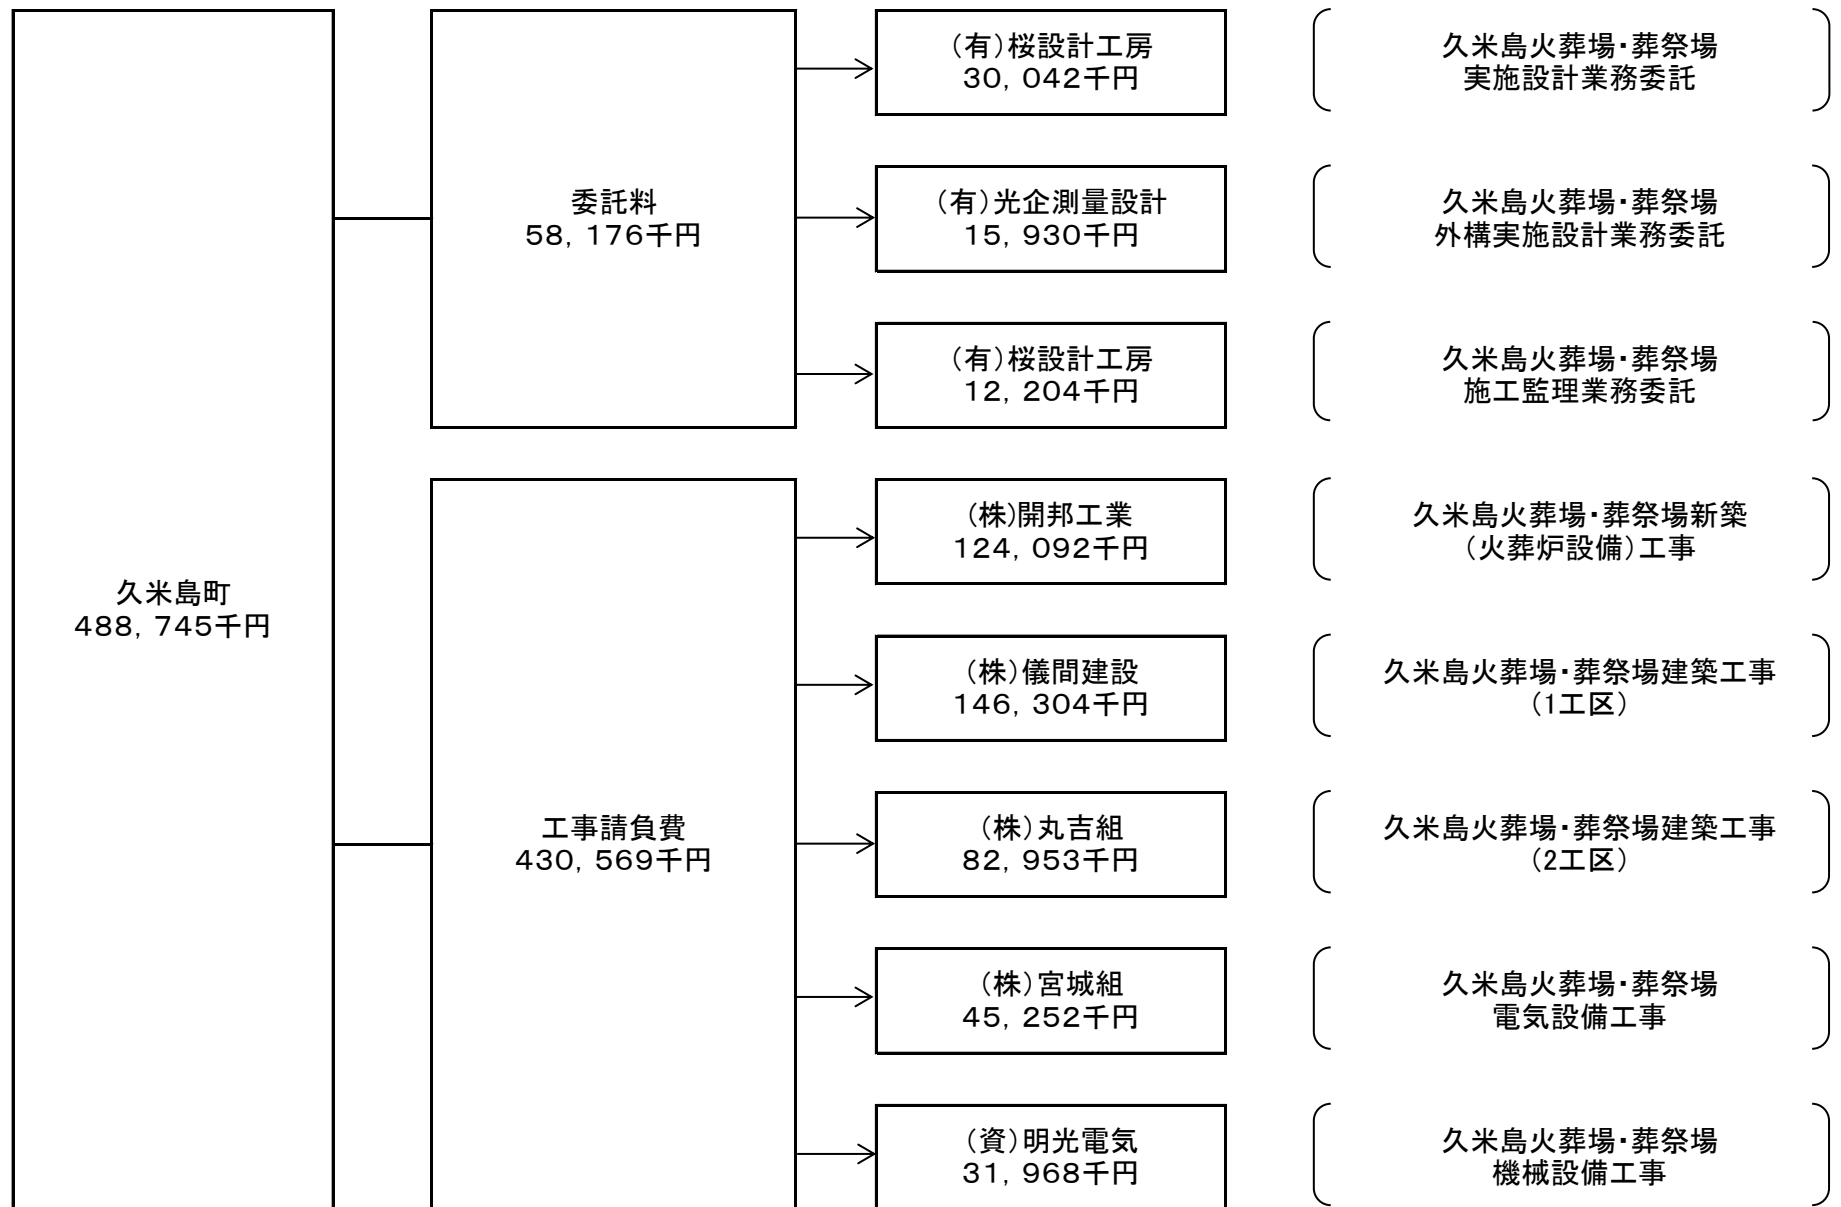

資金の 使途の 流れ、 点検 評価	評価	点検項目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○委託事業者・施工業者は指名競争入札により企業組織、実績、知識等を勘案した上で選定しており妥当であったと考えている。 ○予算規模は目標を達成するために必要な規模であった。 ○費用・使途については事業目的達成の観点から必要なものか当については確定時において支出等に関する書類により確認、適正であった。
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	
	-	受益者との負担関係は妥当であるか。	
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	

市町村名	久米島町						
平成28年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	5-①	球美の島エコアイランド化推進事業			沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-1-(3)-ア	
担当部署名	建設課	事業実施(予定)年度	平成24~28年度		沖縄振興基本方針該当箇所	地球温暖化防止対策の推進	
事業内容	低炭素島社会の実現と自然豊かな環境に配慮した島づくりの推進を図るため、町内に設置されている水銀街灯のLED化事業等を実施する。						
効果発現年度	<input type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(30年度)						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他( )						
予算額・執行額【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)		26年度	27年度	27年度(繰越)	28年度	28年度(繰越)	
	予算の状況	(a)当初予算額	32,648	56,592	-	521,772	-
		(b)予算現額	35,201	56,592	-	542,257	-
		(c)増減額(b-a)	2,553	0	-	20,485	-
		(d)繰越額	0	0	36,316	0	21,629
		A.計(b+d)	35,201	56,592	36,316	542,257	21,629
	B.執行済額	35,201	20,276	36,287	68667	21,629	
	うち交付金充当額	28,161	16,220	29,030	54933	17,303	
	次年度繰越額	0	36,316	0	21629	0	
	執行率(%) (B/A)	100%	36%	100%	13%	100%	
予算の状況の説明	既設電柱にLED灯を取り付けるため、地元自治会と設置箇所の調整・確認作業等に不測の時間を要したため工期の見直しが必要となったことから、年度内の完了が困難となり、繰り越すこととなった。繰越後は当初計画していた事業内容をすべて実施した。						
活動目標(指標)及び達成状況	H28活動目標(指標)		達成状況				
			25年度	26年度	27年度	28年度	
	約535灯のLED防犯灯を整備・設置	目標	(委託・工事)	(委託・工事)	(委託・工事)	(委託・工事)	
		実績	委託・工事	委託・工事	委託・工事	委託・工事	
		目標	( )	( )	( )	( )	
		実績					
達成状況説明	○水銀灯約1650本のうち1630灯(H24:310、H25:241、H26:286、H27:376、H28:417)はLED灯へ移行した。 ※前年度の検証シートの内訳において誤りがあったため、正しい本数に修正しています。						
成果目標(指標)及び進捗状況	H28成果目標(指標)		基準値(年度)	26年度	27年度	28年度	目標値(30年度)
	・LED防犯灯整備率:100% (導入予定:1,650灯)	目標	( )	(43%)	(70%)	(100%)	( )
		実績		48%	72%	99%	
	【H30成果目標】 CO2削減量	目標					321,061kg-CO2
進捗状況説明	当初計画のとおり目標を概ね達成できた。(平成29年6月完了) 地元自治会と設置箇所の調整により1,630基(目標1,650基)となった。						


	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
取組の検証	町内に所在する街路灯のLED化は概ね完了したが、町によるCO2削減の取組を民間にも波及させ、町全体での低炭素社会を実現するには、民間の自発的な取組の推進が課題である。	LED灯への移行を計画的に実施し消費電力の削減及びCO2削減を図ると共に、一般町民へ更なる『低炭素島しょ社会の実現』を意識したCo2削減のPR活動等も必要である。

**今後の取り組み方針**

これまで設置したLED灯の維持管理に努め、必要箇所に関しては地域等と意見を交わしながら単独費等で整備し「低炭素社会・島しょ社会」の実現に向けて努める。また、町の広報媒体(広報誌、ラジオ等)を活用したPR活動を積極的に進めていく。

**資金の流れ**  
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費
90,296	90,296	72,236	18,060	0

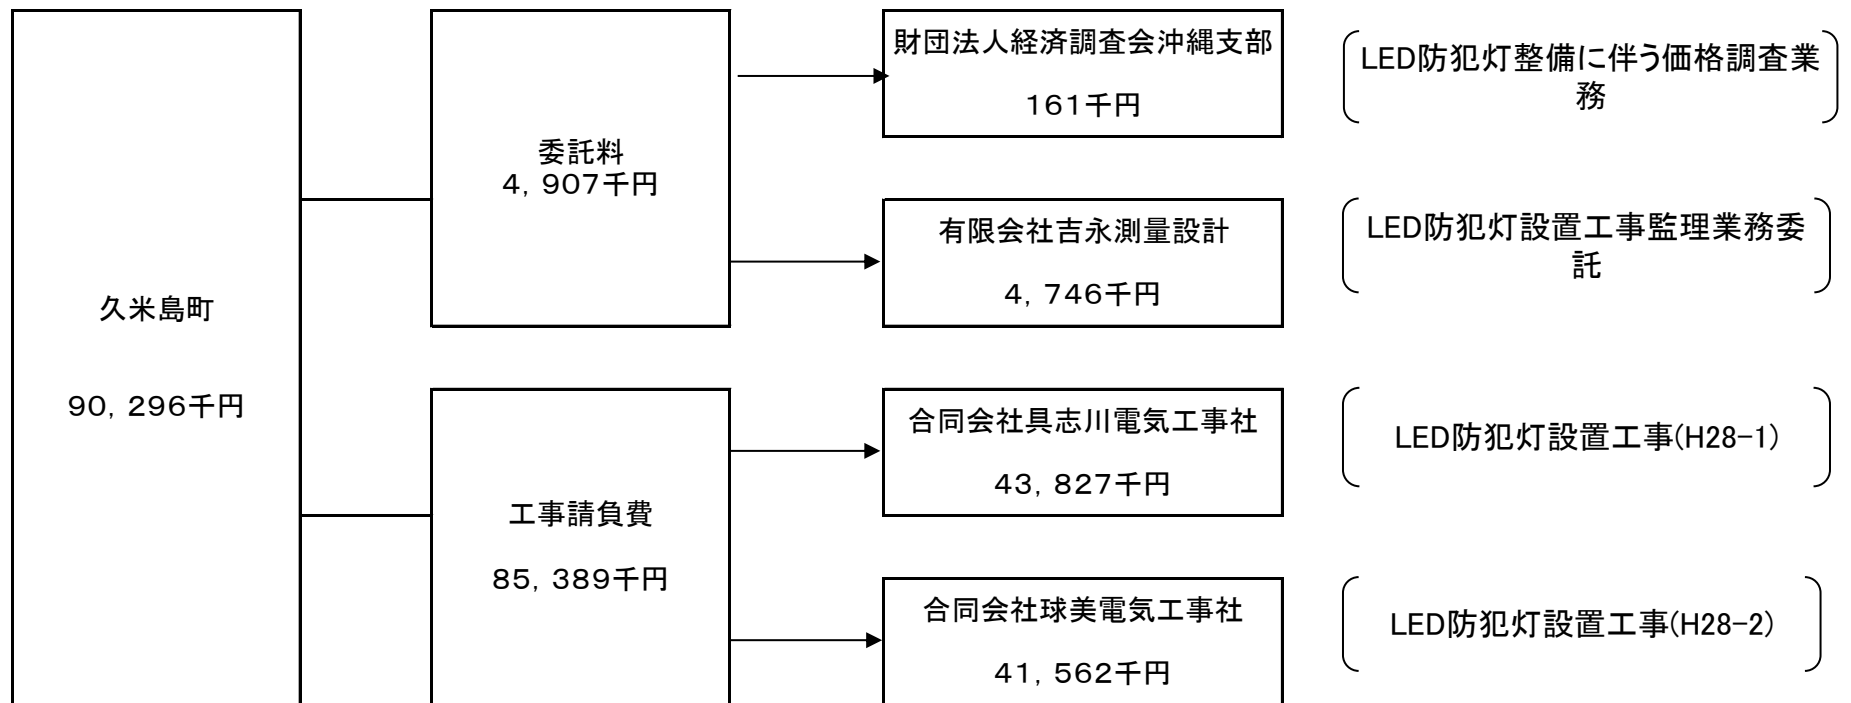

資金の 使途の 流れ、 点検 評価	評価	点検項目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○委託事業者・施工業者は指名競争入札により企業組織、実績、知識等を勘案した上で選定しており妥当であったと考えている。 ○不用額はなく適正な予算規模であった。 ○費目・使途については事業目的達成の観点から必要なものなのか等について確定時において支出の等に関する書類により確認、適正であった。
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	
	-	受益者との負担関係は妥当であるか。	
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	

市町村名	久米島町						
<b>平成28年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】</b>							
事業番号・事業名	5-②	球美の島緑化推進事業		沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-1-(1)-イ		
担当部課名	建設課	事業実施(予定)年度	平成24~28年度	沖縄振興基本方針該当箇所	陸域・水辺環境の保全		
事業内容	久米島在来の花木を保全し、魅力的な観光地としての景観形成を図るため、久米島に自生している花や花木(クメノサクラ、ツツジ、椿、ショウキズイセン等)の在来花木を年中楽しむことができる公園整備を実施する。						
効果発現年度	<input type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(30年度)						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他( )						
予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)		26年度	27年度	27年度(繰越)	28年度	28年度(繰越)	
	予算の状況	(a) 当初予算額	35,000	39,415	-	55,000	-
		(b) 予算現額	35,902	38,686	-	49,040	-
		(c) 増減額(b-a)	902	▲729	-	▲5960	-
		(d) 繰越額	0	0	2,115	0	13,659
		A. 計(b+d)	35,902	38,386	2,115	49,040	13,659
	B. 執行済額		35,902	36,571	2,115	35,374	13,658
	うち交付金充当額		28,721	29,256	1,691	28,299	10,926
	次年度繰越額		0	2,115	0	13,659	0
	執行率(%) (B/A)		100.0%	95.3%	100.0%	72%	100%
予算の状況の説明		工事施工箇所内に設置されていた電柱を移転する必要があり、電柱の管理者である電力会社と移転に係る補償交渉に不測の日数を要したため13,659千円繰り越したが、当初計画していた事業内容をすべて実施した他、活動目標、成果目標の達成状況を鑑みて適正と考えている。					
活動目標(指標)及び達成状況	H28活動目標(指標)		達成状況				
			25年度	26年度	27年度	28年度	
	ツツジゾーン、植栽工事の実施及び駐車場整備工事の完了	目標	( 造成工事 )	( ツツジゾーン、ツバキゾーン造成工事 )	( ツツジゾーン、ツバキゾーン造成・植栽工事 )	( ツツジゾーン、ツバキゾーン造成・植栽工事 )	
		実績	造成工事	ツツジゾーン造成工事	多目的ゾーン造成及び植栽工	ツツジ・ツバキゾーン造成、張芝、管理用道路、駐車場	
	固有種等花木の品種登録	目標	( )	( )	( 2品目 )	( )	
実績				0品目			
達成状況説明	平成28年度は、ツバキ・ツツジゾーンの造成及び張り芝の植栽、管理用道路、駐車場、排水施設の整備を行い、すべての事業が完了した。						
成果目標(指標)及び進捗状況	H28成果目標(指標)		基準値(年度)	26年度	27年度	28年度	目標値(30年度)
	ツツジゾーン、植栽工事及び駐車場整備工事の完了	目標	( )	( ツツジゾーン、ツバキゾーン造成工事完了 )	( ツツジゾーン、ツバキゾーン造成工事完了 )	( ツツジゾーン、ツバキゾーン造成工事完了 )	( )
		実績		ツツジゾーン造成工事完了	多目的ゾーン造成及び植栽	ツツジゾーン、ツバキゾーン造成・植栽工事	
	品種登録を行い園芸振興による知名度向上を図る	目標	( )	( )	( 品種登録 )	( )	( )
		実績			品種登録		
【H30成果目標】 観光地としてふさわしい景観形成が図られているか(80%以上)を含め、観光客を対象としたアンケートにより、本事業のあり方について検証する。	目標					80%	
進捗状況説明	ツツジ・ツバキゾーン内の造成、管理用道路、排水施設、張り芝、駐車場を整備し全事業が完了した。(平成29年7月完了)						


取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	・公園について、台風や強風時には一部について潮害および風害が見受けられる。	・公園について、潮害および風害の対策を講ずる必要がある。

**今後の取り組み方針**

・公園について、潮害および風害の対策として、周囲に防風林を植栽し、育成を推進。在来花木を年中楽しむことができる公園整備を実施する。

**資金の流れ**  
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

総事業費	交付対象事業費	交付金		交付対象外経費
		充当額	市町村負担金	
49,032	49,032	39,225	9,807	0

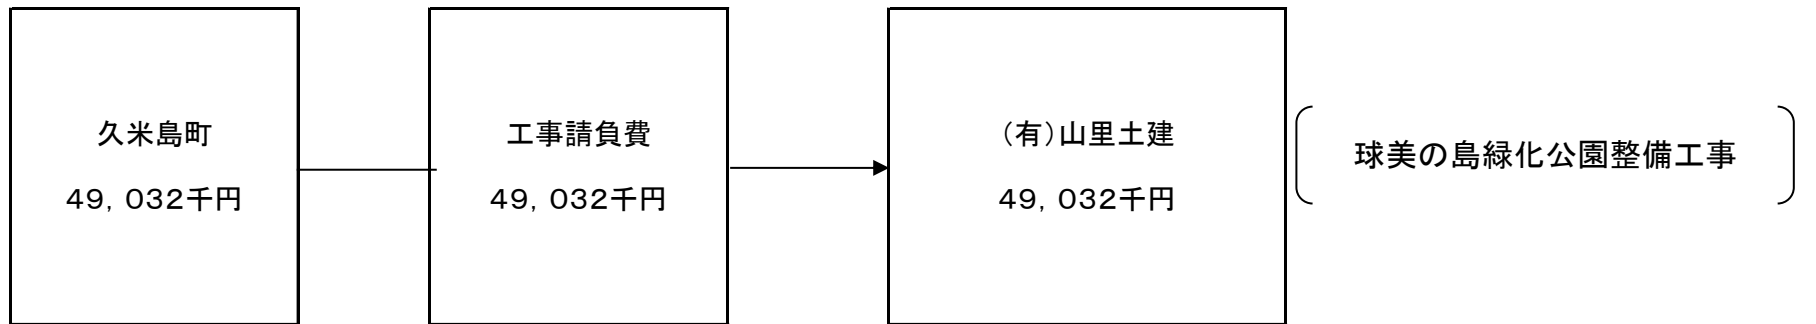

資金の 使途の 流れ、 点検 評価	評価	点検項目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○工事施工業者指名競争入札により企業組織、知識等を勘案した上で選定しており、妥当であると考えている。 ○予算規模については適正な規模であったと考えている。 ○費目・使途については、事業目的達成の観点から必要性等について額の確定時において、支出等に関する書類により確認、適正であった。
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	
	—	受益者との負担関係は妥当であるか。	
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	
